สรุปปริมาณน้ำ
พื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี
และ มาตรการป้องกัน
การขาดแคลนน้ำปี 2569

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569


ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำพื้นที่ชลบุรี - ระยอง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569

รายการ	ชลบุรี		ระยอง			ประแสร์
	2 อ่างฯ ชลบุรี		3 อ่างฯ ระยอง			
	บางพระ	หนองค้อ	ดอกกราย	หนองปลาไหล	คลองใหญ่	
ปริมาณน้ำเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	117.00	21.40	71.40	163.75	40.10	295.00
(เพิ่มความจุชั่วคราว)		23.40	79.41	187.62	51.10	
ปริมาณน้ำ วันที่ 4 พ.ย. 69	116.17	22.00	73.97	179.03	43.29	269.12
ร้อยละความจุปกติ	99.3%	102.8%	103.6%	109.3%	108.0%	91.2%
(ร้อยละความจุชั่วคราว)		94.0%	93.1%	95.4%	84.7%	
ปริมาณน้ำใช้การ (หัก Dead Storage) (ล้าน ลบ.ม.)	104.12	21	70.97	165.53	33.79	249.12
ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่าง (ล้าน ลบ.ม.)	0.29	0.51	1.23	1.49	0.02	0.69
วันที่ 3 พ.ย. 69	0.80		2.74			
ปริมาณน้ำเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน	3.00	-0.10	-1.47	0.00	2.66	1.32
(-ลดลง, +เพิ่มขึ้น) (ล้าน ลบ.ม.)	2.90		1.19			
ปริมาณน้ำแต่ละพื้นที่	138.17 ล้าน ลบ.ม. (99.8%)		296.29 ล้าน ลบ.ม. (107.6%)			


หมายเหตุ ข้อมูลสถานการณ์น้ำมาจากรายงานของกรมชลประทาน ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569

ปกติ 50 - 80%	ฉุกเฉิน 30 - 50%	วิกฤต <30%


สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำรวม 2 อ่างฯชลบุรี (บางพระ หนองค้อ)

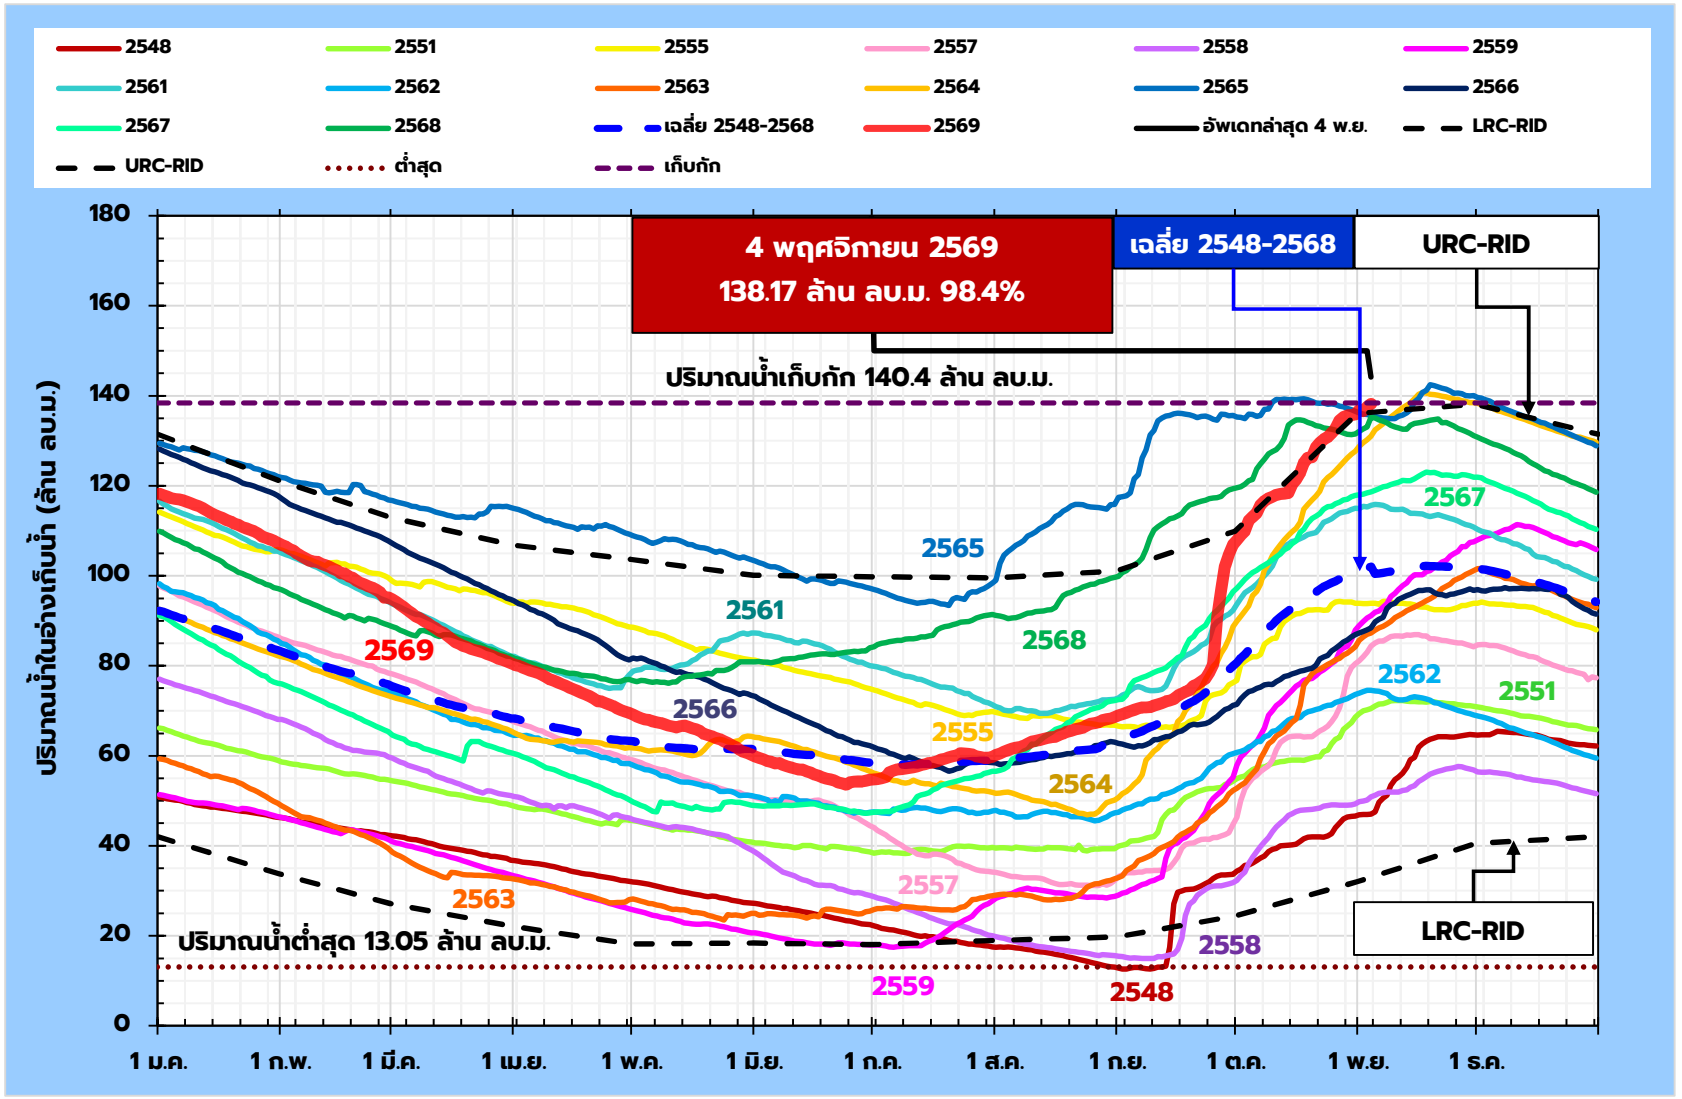


สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำบางพระ

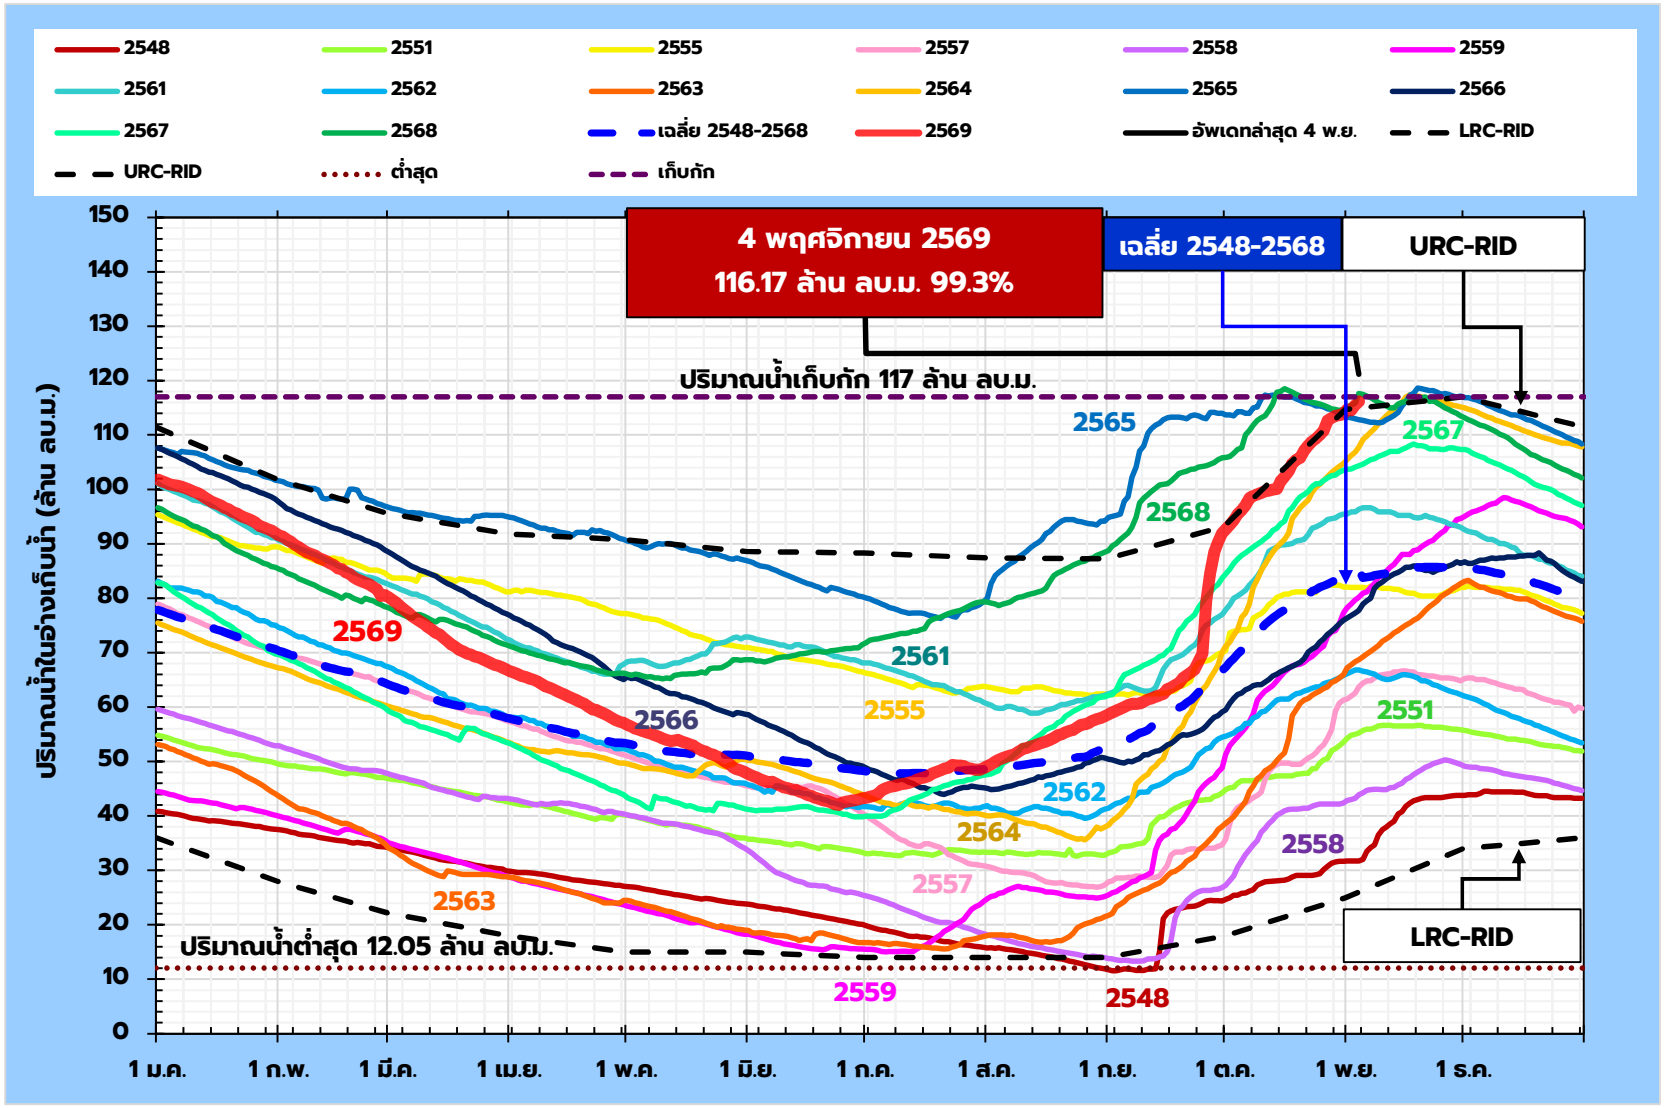


สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำหนองค้อ

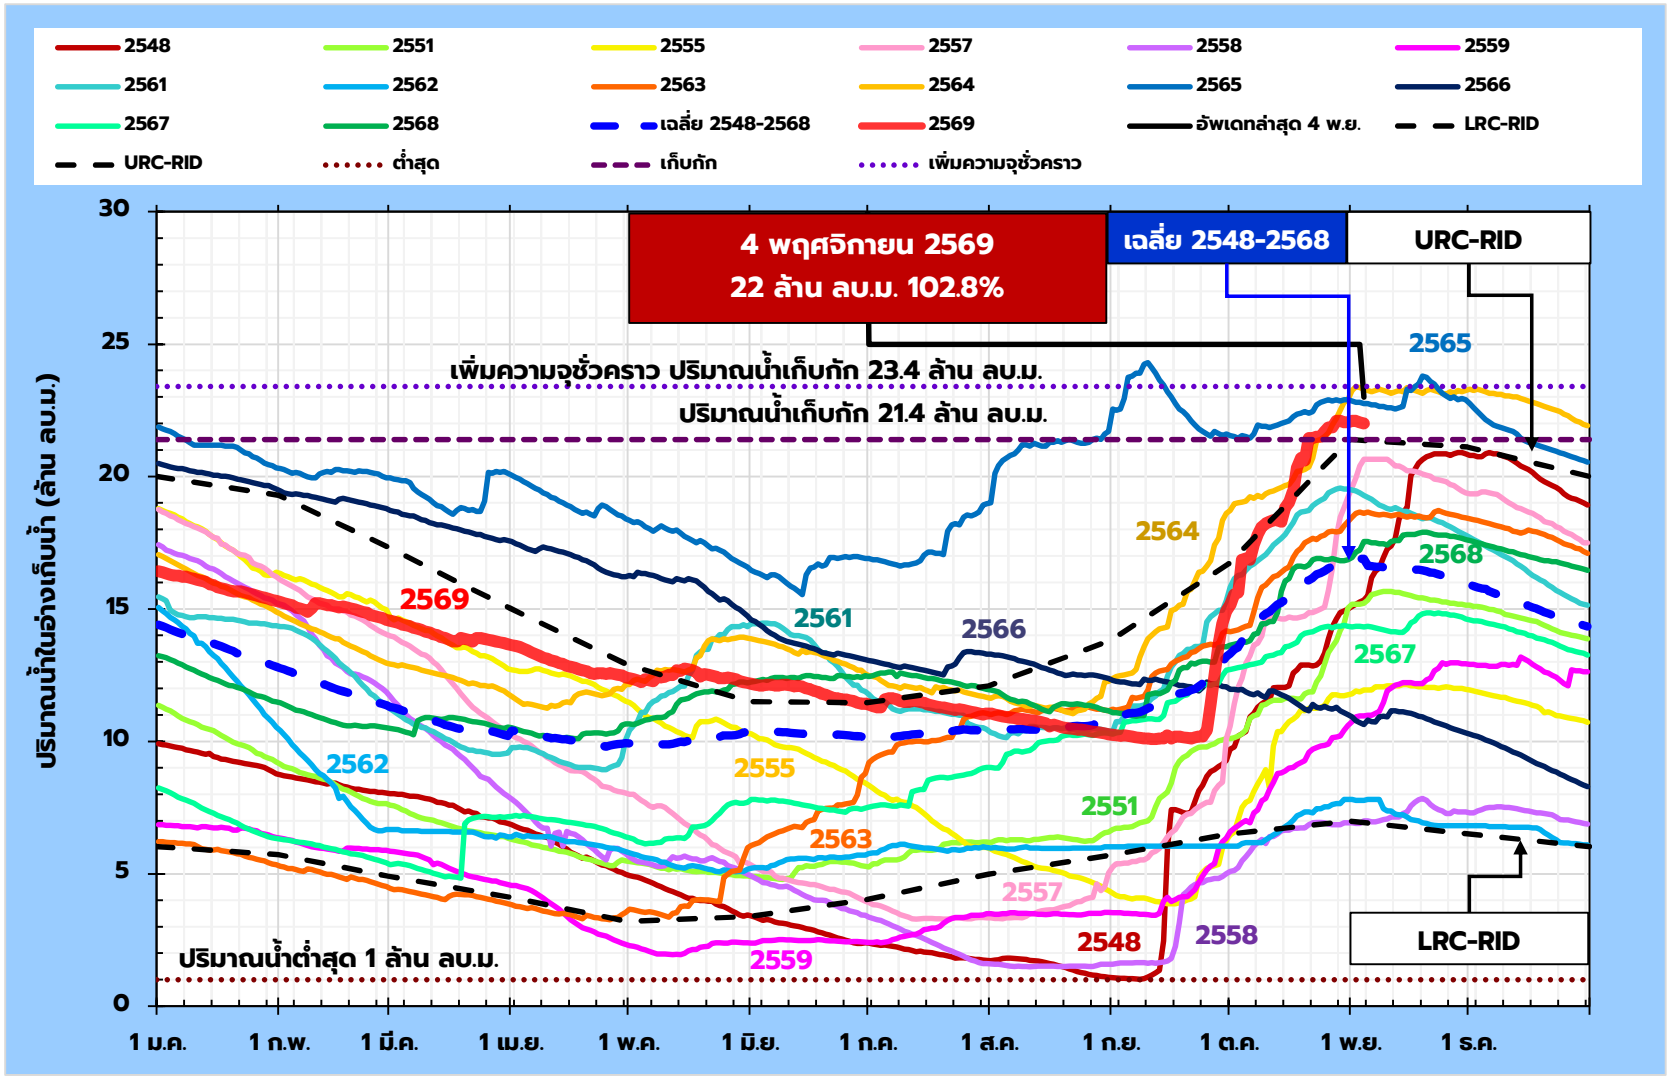


สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำรวม 3 อ่างฯระยอง (ดอกกราย หนองปลาไหล คลองใหญ่)

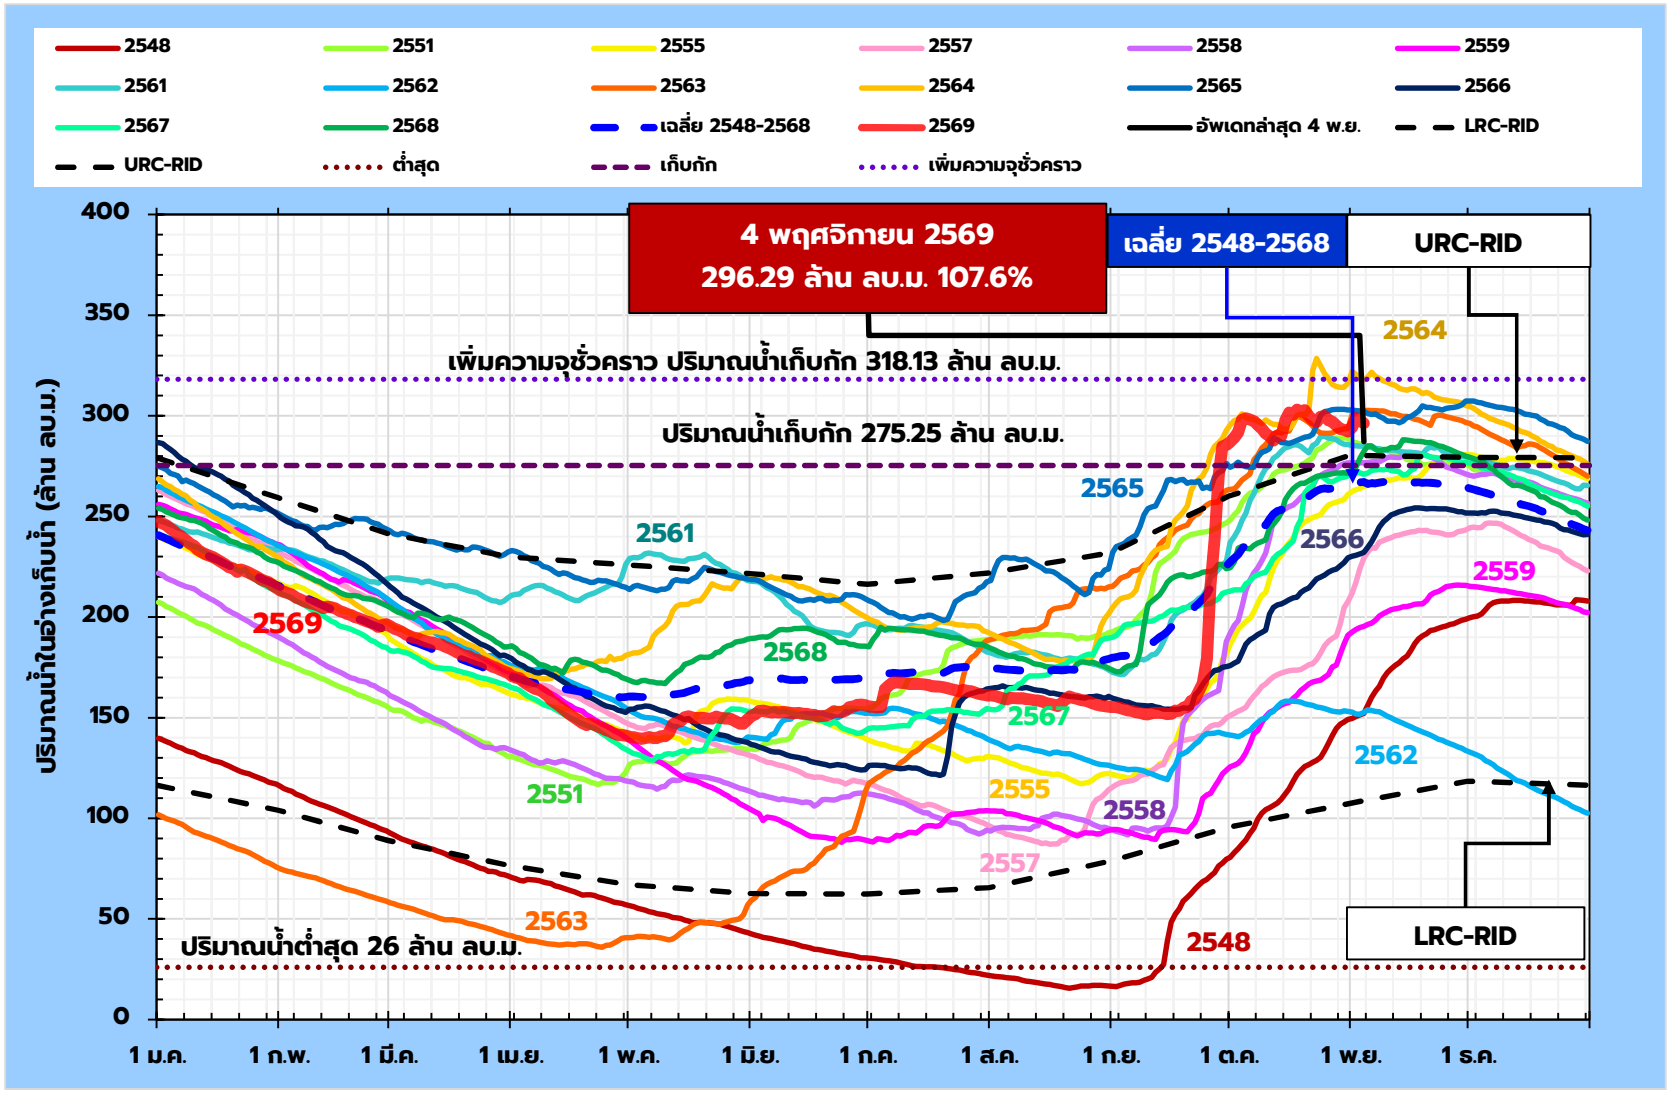


สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำดอกกราย

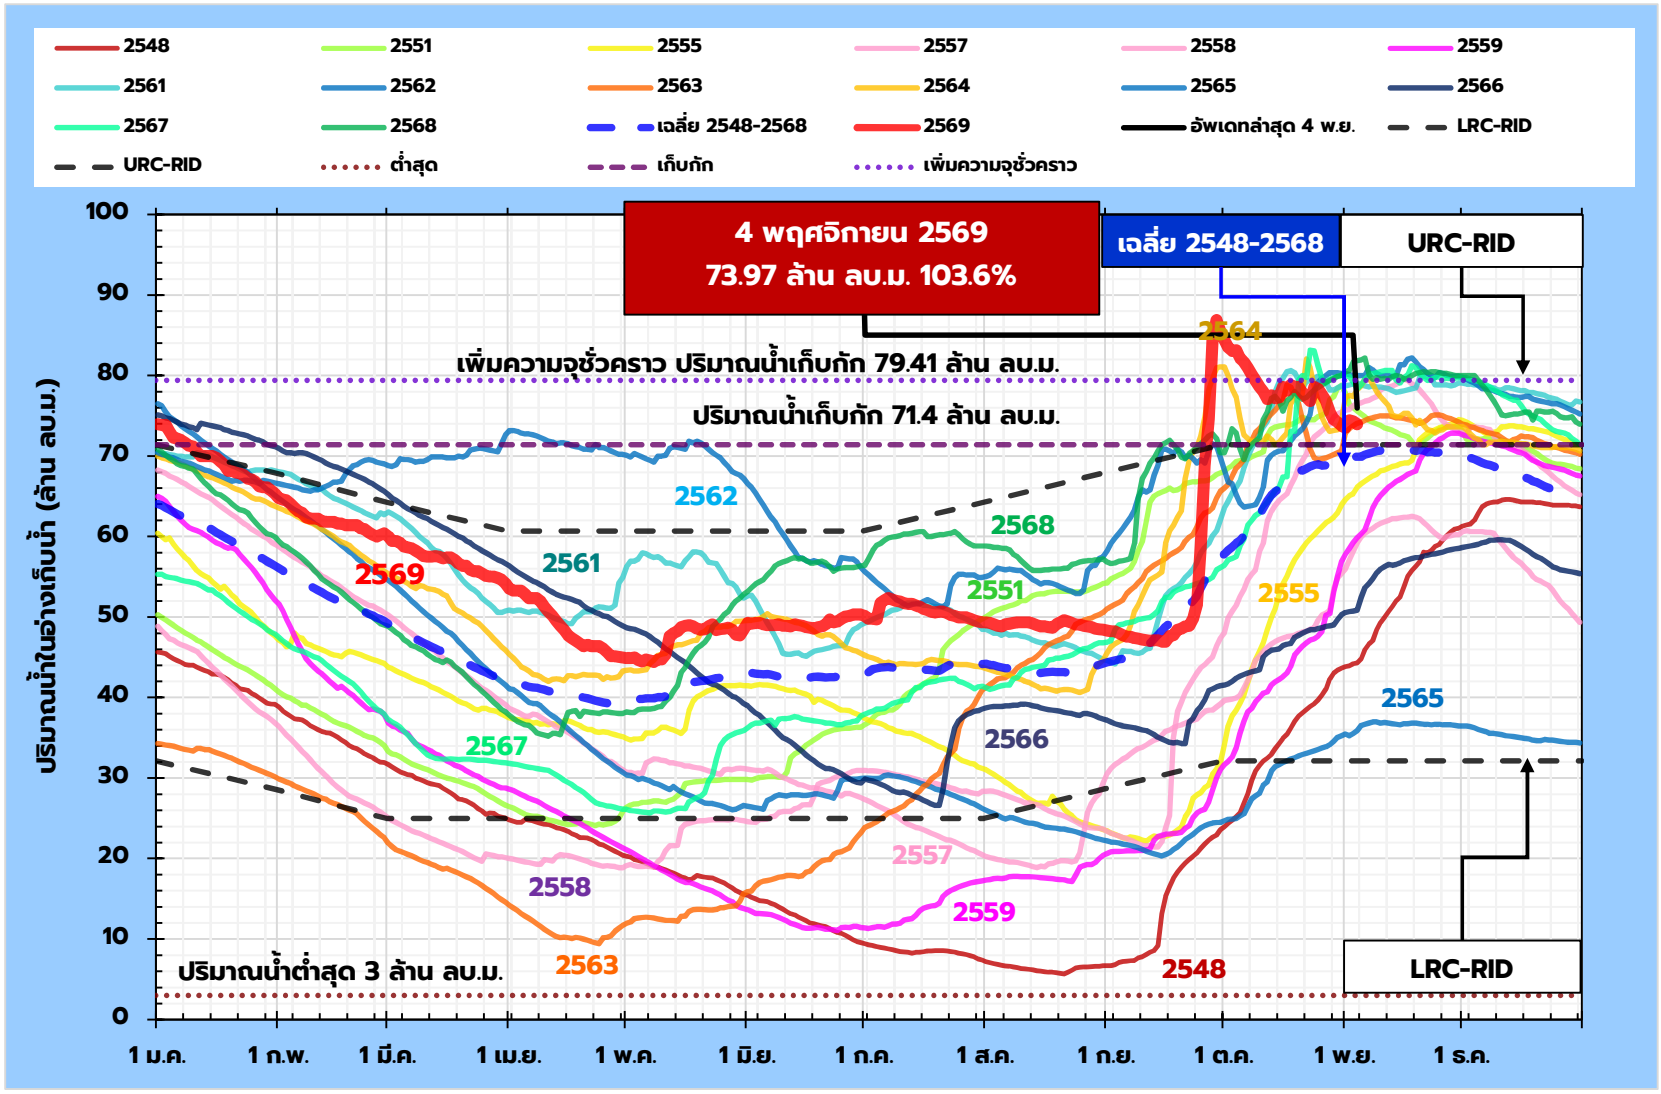


สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

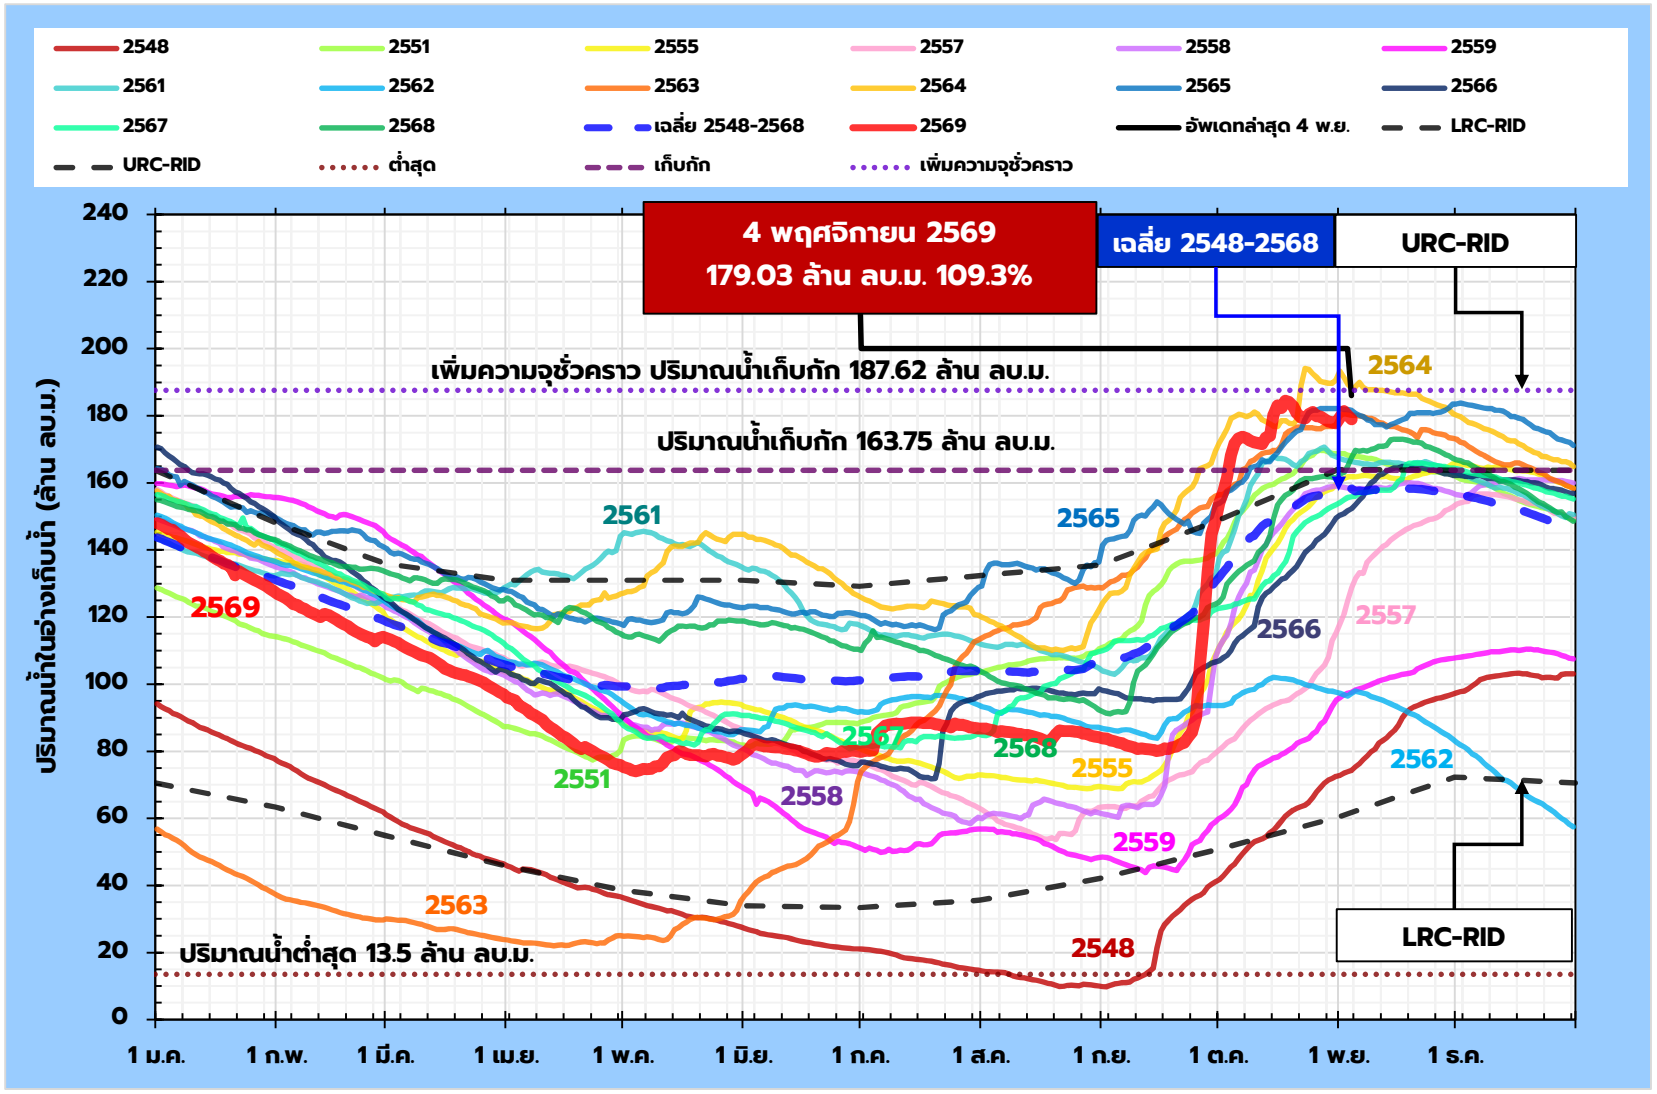

สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่

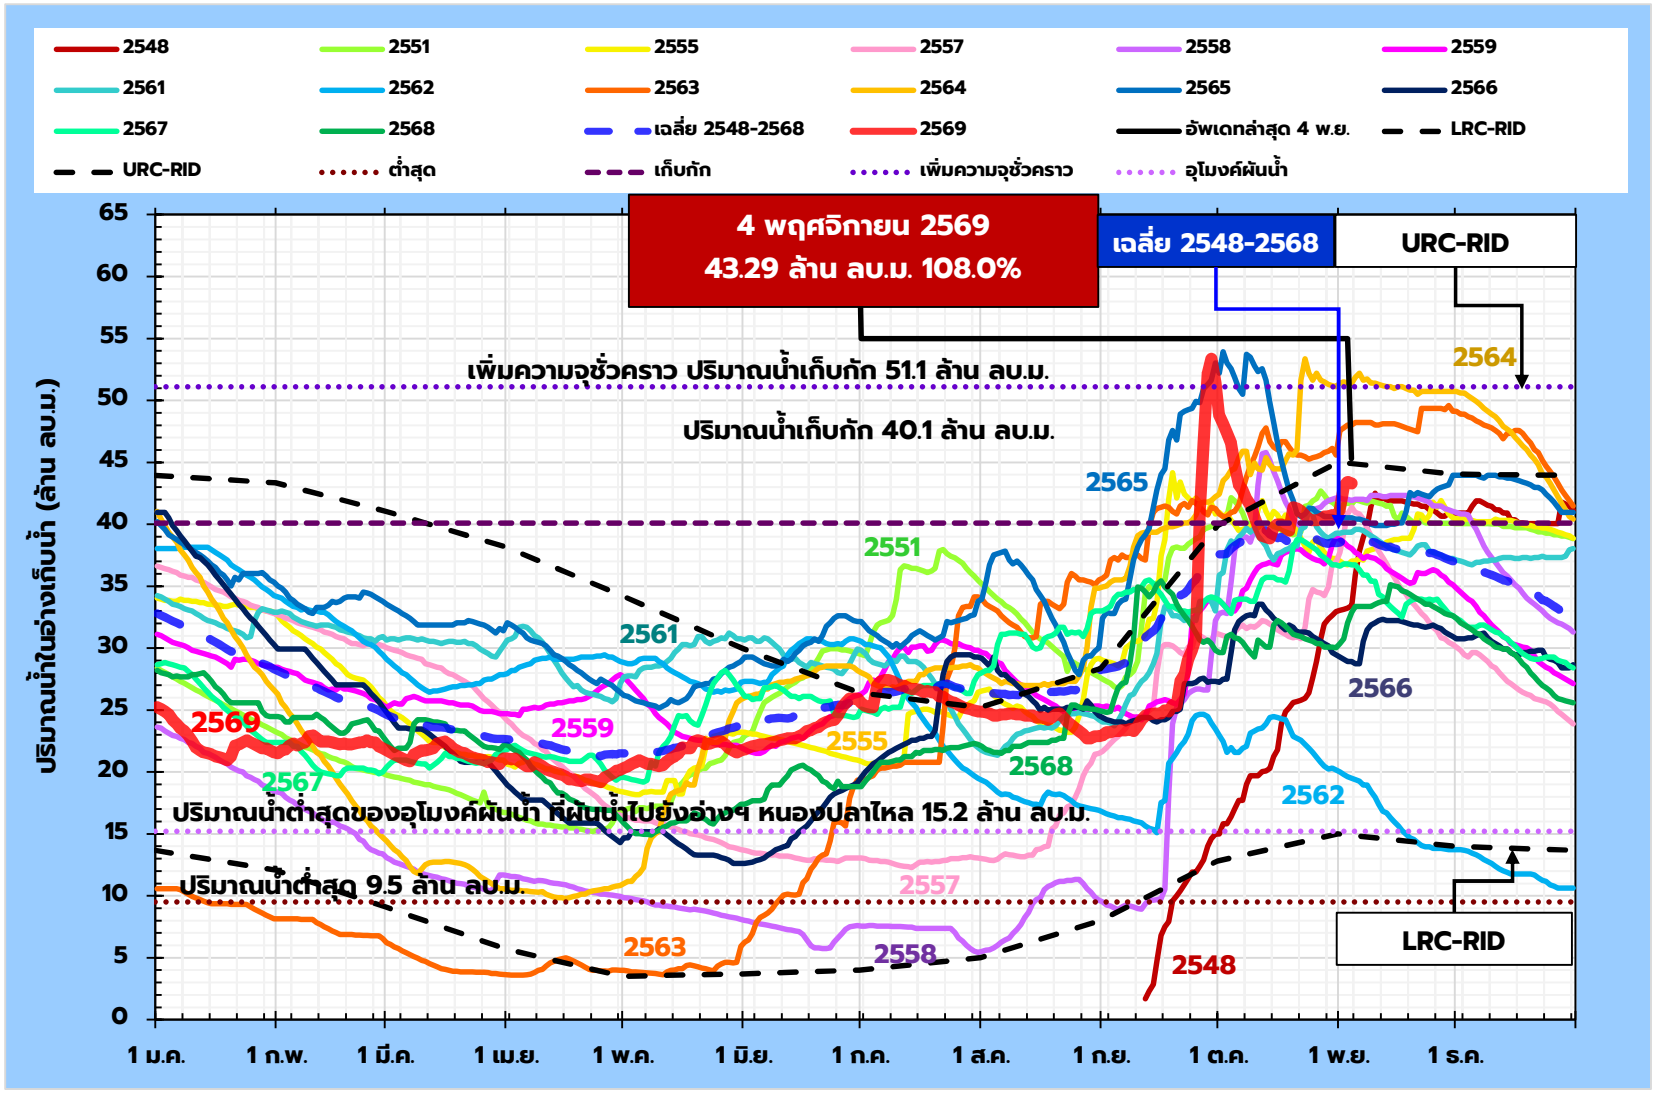

สถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำประแสร์

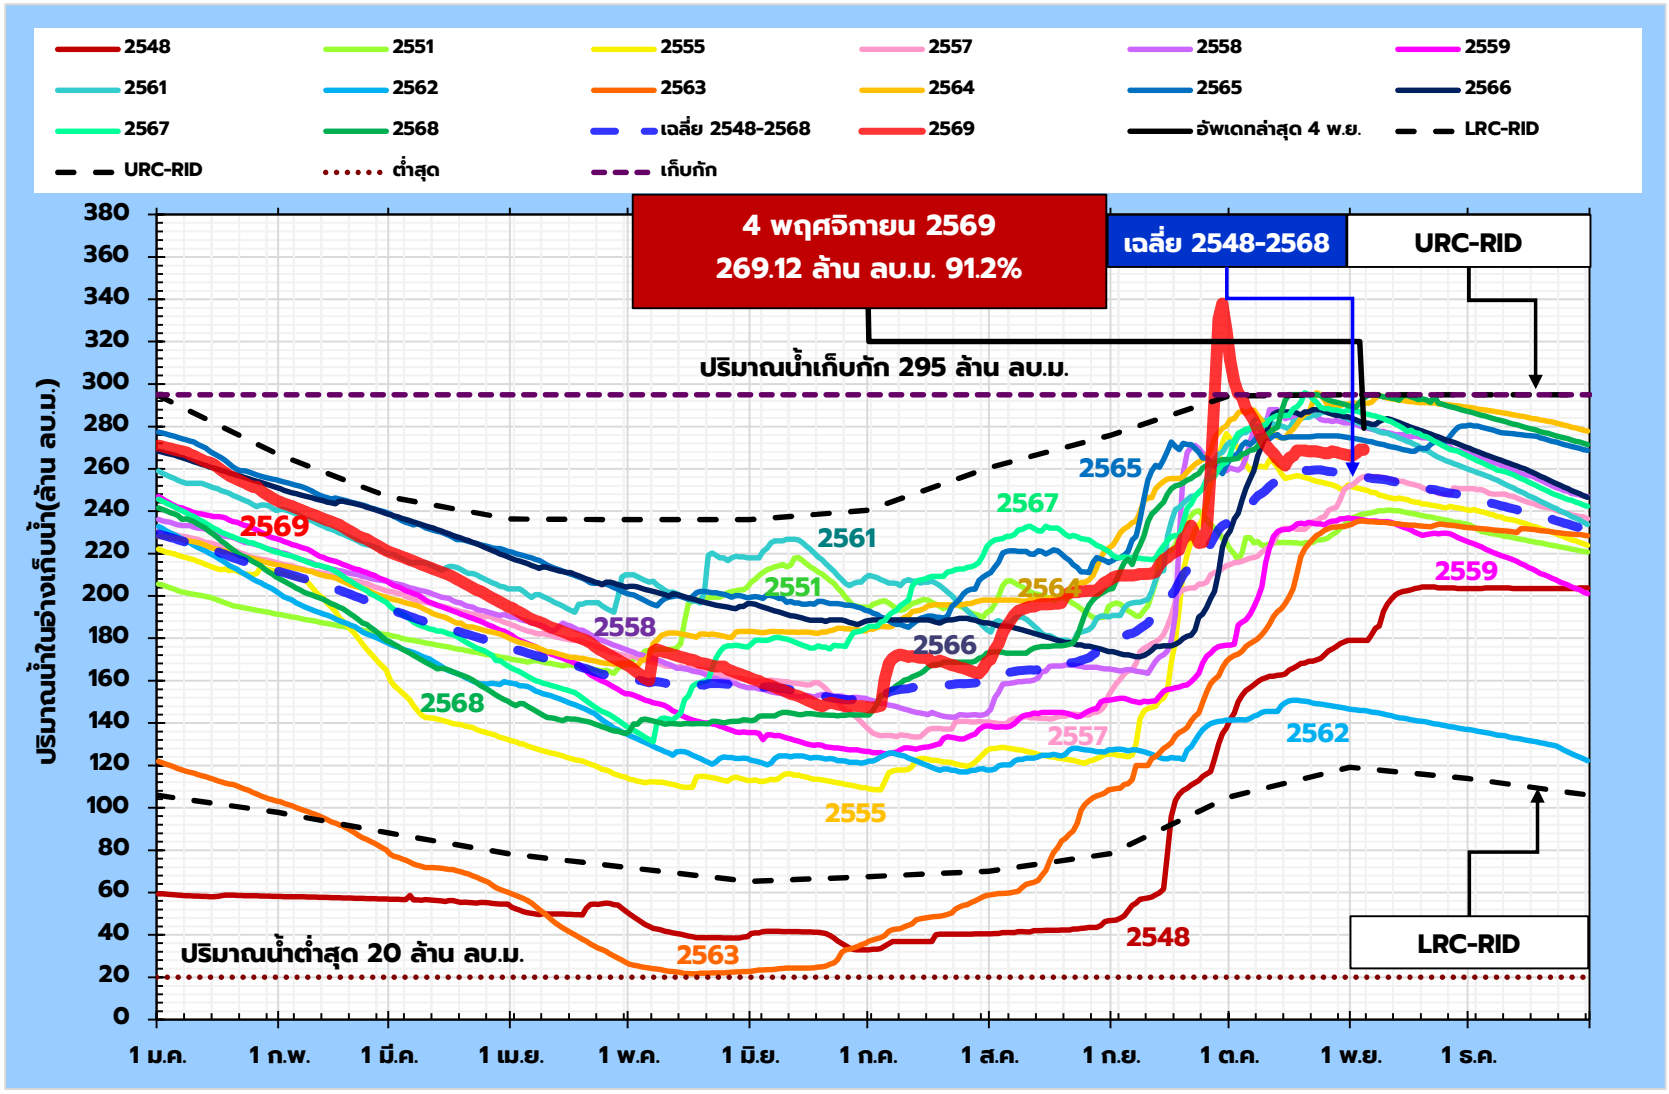


สรุปงานเตรียมความพร้อมในการป้องกันการขาดแคลนน้ำปี 2569

มาตราการ				แผน/ปริมาณน้ำสูบ 2569 (ล้าน ลบ.ม.)												
ลำดับ	แหล่งน้ำ	โครงข่าย	ข้อมูล	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
1	ประแสร์	ประแสร์ - คลองใหญ่	แผน	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	**78.00**
			ผล	4.09	5.47	6.70	6.67	6.55	7.01	7.23	7.27	6.36	0.00	0.00		**57.35**
2	ประแสร์	คลองสะพาน - ประแสร์	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.50	3.50	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	**25.00**
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	4.71	5.80	8.06	7.53	0.00	0.00		**27.08**
3	ประแสร์	วังตโนด - ประแสร์	แผน	-	-	-	-	-	14.00	13.00	13.00	12.84	13.00	-	-	**65.84**
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.51	9.94	0.00	0.00		**21.45**
4	หนองปลาไหล	ละหารไร่ - หนองปลาไหล	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	**7.00**
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.91	0.68	0.48	1.30	0.17	0.00		**3.70**
5	สระทับมา	สระทับมา - มาบตาพุด - สัตหีบ	แผน	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	**6.00**
			ผล	0.00	0.00	0.00	1.03	0.71	0.34	0.00	0.02	0.00	1.71	0.00		**3.81**
6	บางพระ	คลองพระองค์/พานทอง - บางพระ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75	15.00	15.00	15.00	15.00	8.75	0.00	**77.50**
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03	11.81	15.55	13.96	0.85	1.30		**47.50**
7	บางพระ	แม่น้ำบางปะกง - บางพระ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	6.20	6.00	6.20	3.00	0.00	**24.50**
			ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	4.75	5.32	1.25	0.00		**14.18**


หมายเหตุ: การสูบผันน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสถานการณ์น้ำ

Update ล่าสุด วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569


Target Line และการคาดการณ์สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำพื้นที่ชลบุรี

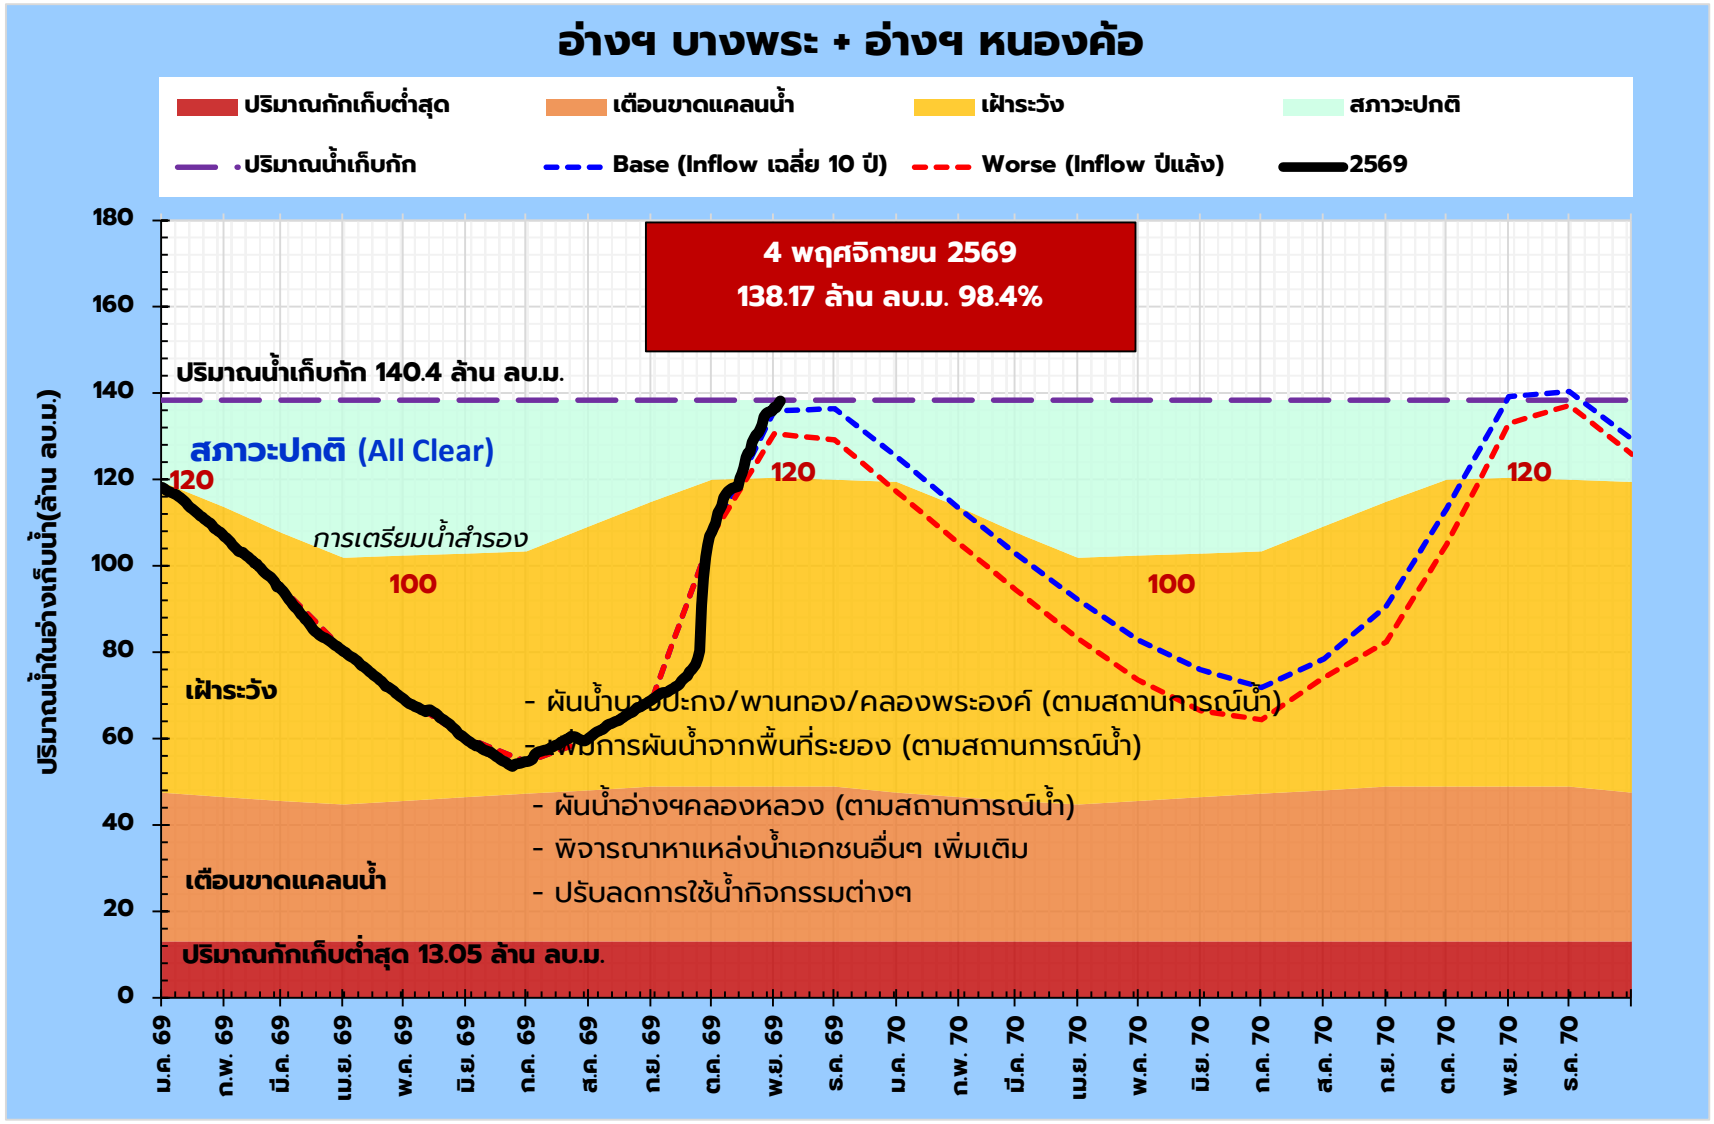

Target Line และการคาดการณ์สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำพื้นที่ระยอง

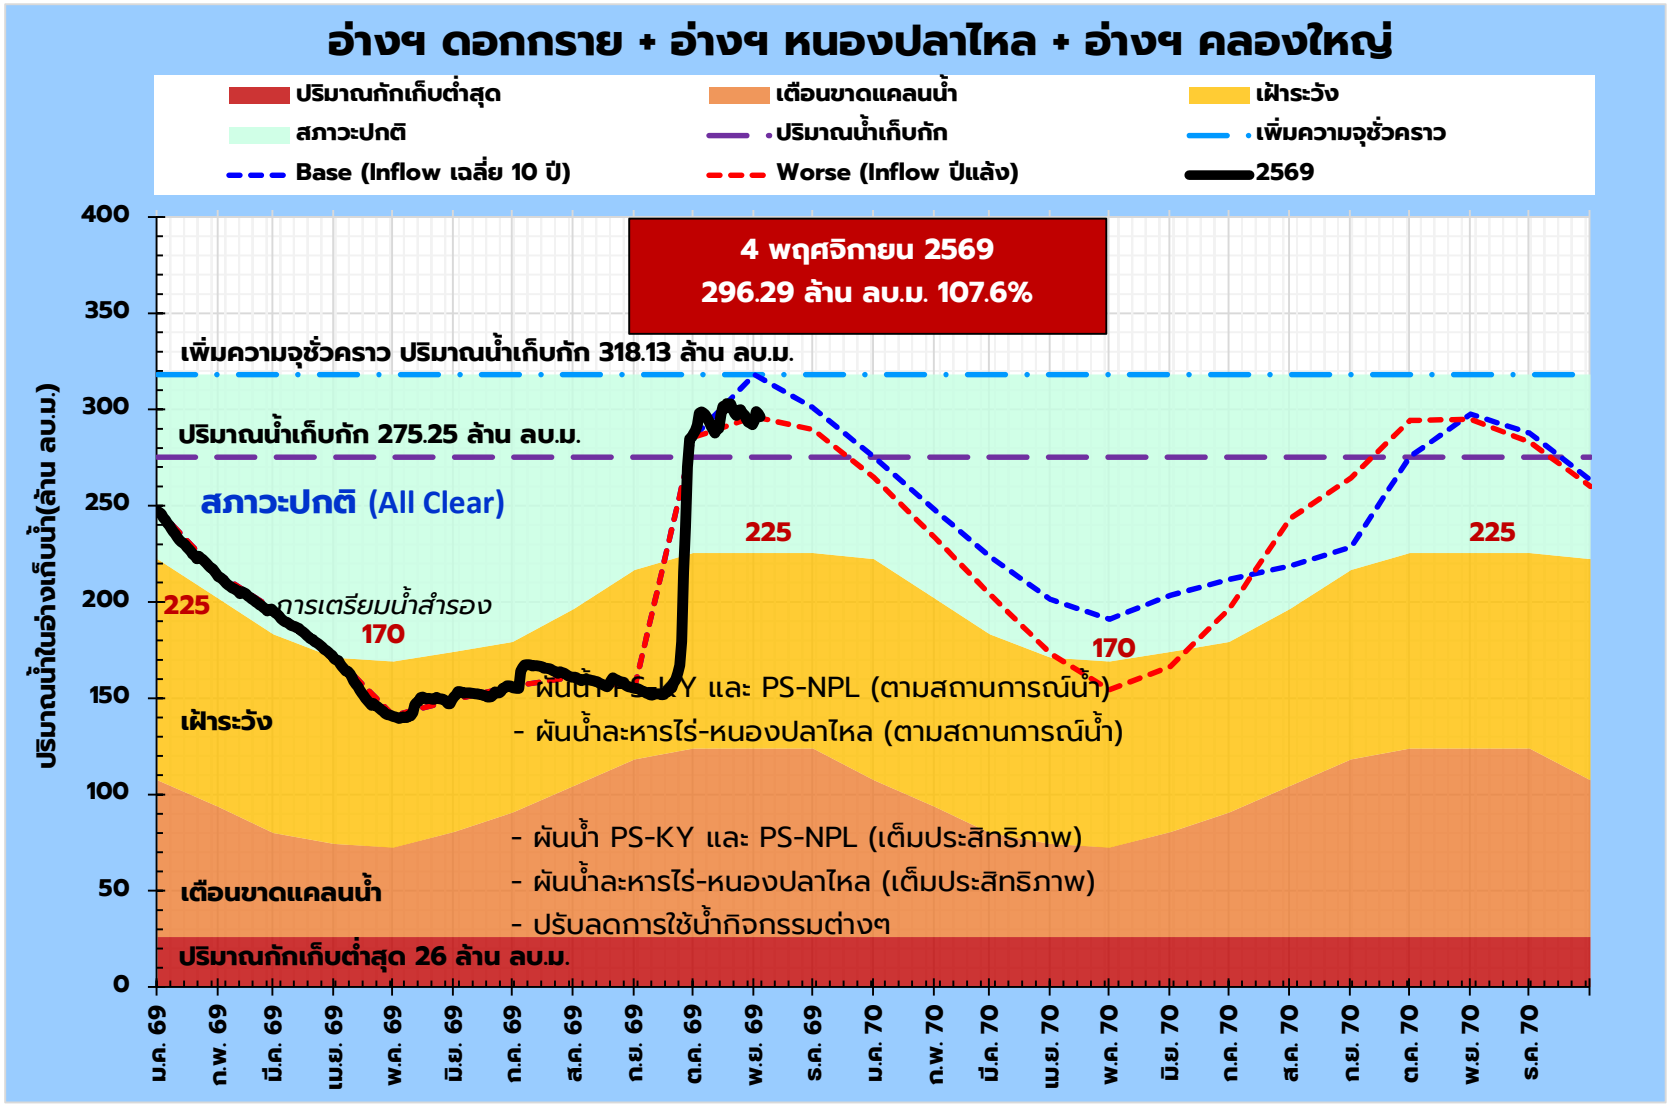

Target Line และการคาดการณ์สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์

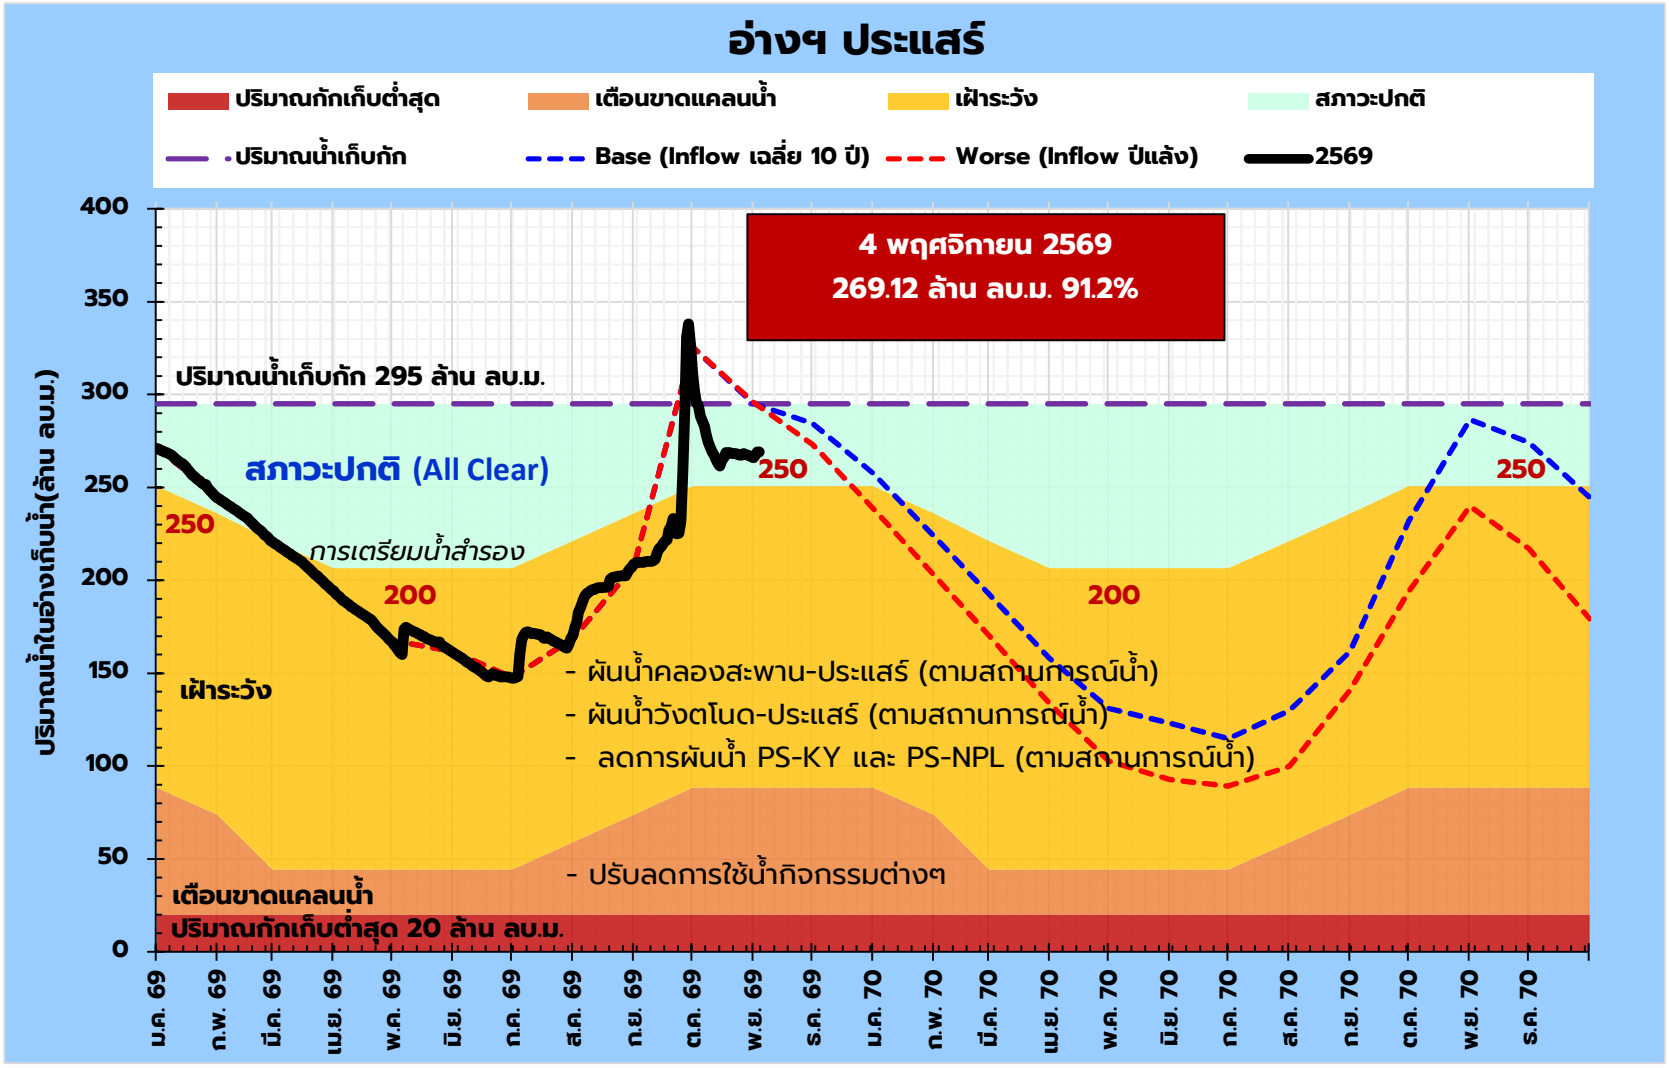

THANK YOU

eastwater

Water War Room
